

富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る 期初改修施工業務及びBリーグ改修・魅力化改修施工業務

令和7年 9月

工事名：富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る期初改修施工業務及び
Bリーグ改修・魅力化改修施工業務の現況についてお知らせ致します。

8/1より全館休館し、改修工事を開始しました。



7月末撮影



8月末撮影


8/1より全館休館となり、改修工事を開始しました。作業エリアの仮囲い設置を進めています。
今後は建物外周に全面足場を組立し、外部・内部ともに工事を進めていきます。

進捗状況

今回の工事の主目的のひとつ、地震に強い天井への改修を進めています



○第1アリーナの天井面で既存の仕上げ材を撤去しています。
今後、鉄骨材を取付けて、再度天井の仕上げを行います。

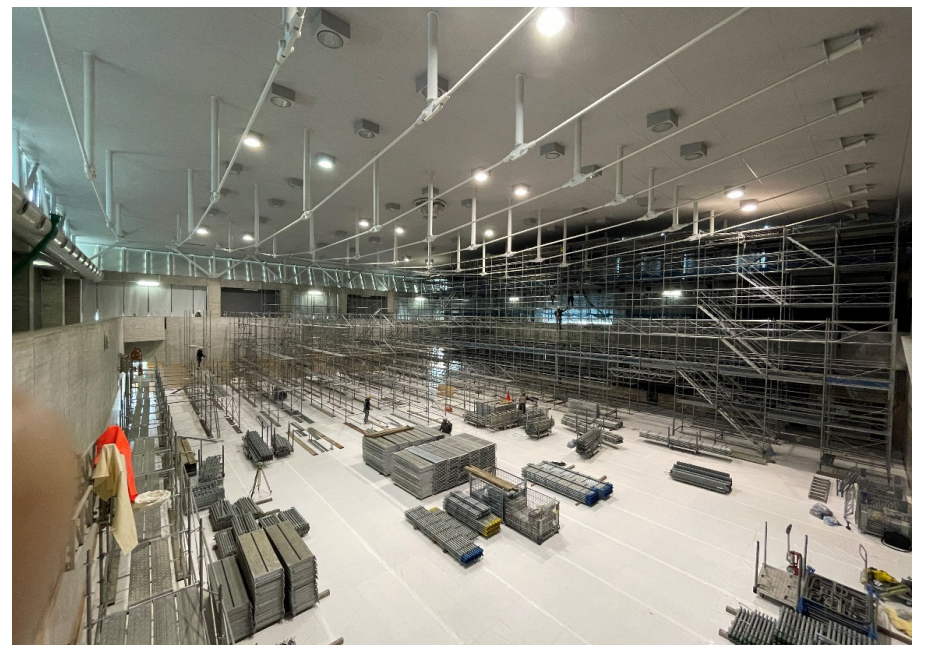

○第2アリーナの内部足場組立状況です。
内部足場組立が終わり次第、既存の天井仕上げ材を撤去していきます。

■R7.9月の主な工事予定

外部	外部足場、仮囲い組立
第1アリーナ	補強鉄骨材取付、天井下地組立
第2アリーナ	内部足場組立

注：上記は予定であり作業内容、期間が変わる場合があります。

富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る
期初改修施工業務及びBリーグ改修・魅力化改修施工業務

発注者：とやまアリーナコンセッション株式会社
施工者：前田建設工業(株)北陸支店
とやまアリーナ作業所
