

富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る
期初改修施工業務及びBリーグ改修・魅力化改修施工業務

令和7年 11月

工事名：富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る期初改修施工業務及び
Bリーグ改修・魅力化改修施工業務の現況についてお知らせ致します。

外壁修繕工事のための足場組立がほぼ完了しました。



9月末撮影




全景写真(南東上空より撮影)

10月末撮影


外壁修繕工事のための足場組立がほぼ完了し、体育館全体が足場で覆われました。
今後は来年3月の足場解体完了までの間、外壁の清掃や塗装、シーリングの打ち替えを進めていきます。

進捗状況

今回の工事の主目的のひとつ、地震に強い天井への改修を進めています

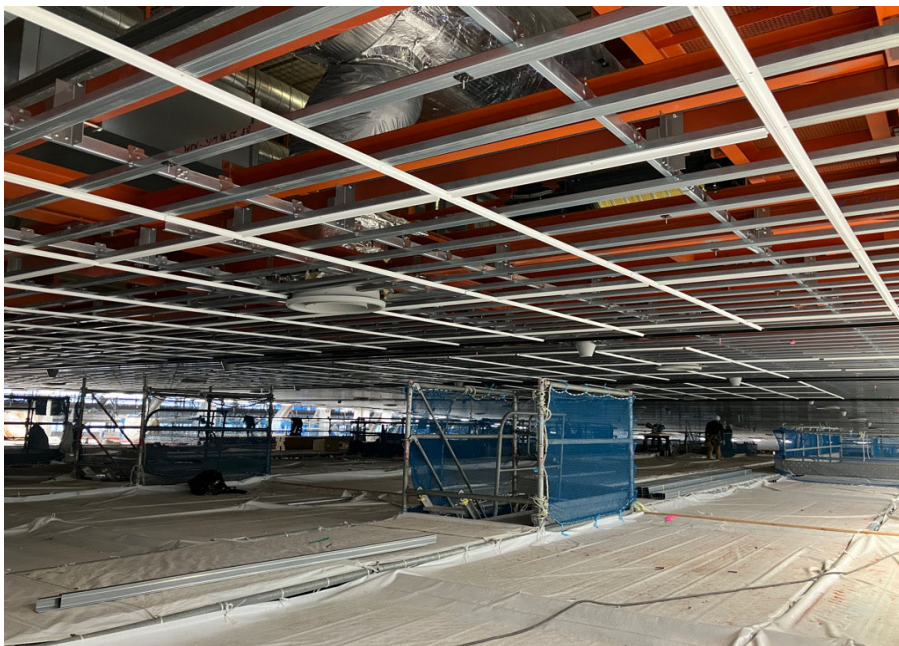

○第1アリーナの天井面で天井用の下地を取付しています。
今後、天井の仕上げ材であるグラスウールボードの
取付を進めていきます。

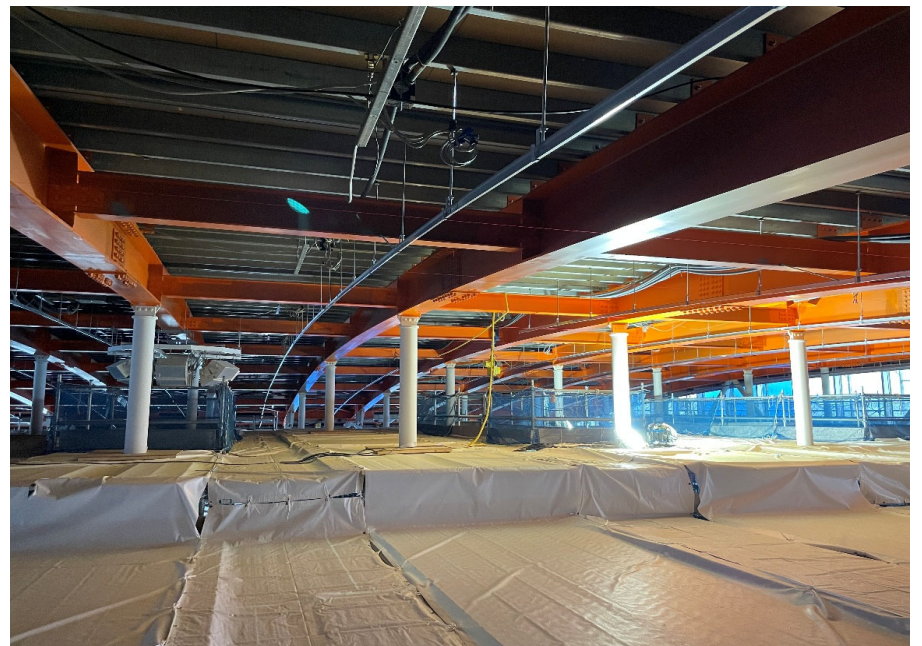

○第2アリーナの既存天井仕上げ材の撤去が完了しました。
現在補強鉄骨の製作を進めており、11月末より
補強鉄骨の取付を進めていきます。

■R7.11月の主な工事予定

外部	外壁修繕工事
第1アリーナ	補強鉄骨材取付、天井下地組立、天井仕上げ 既存躯体解体、補修（Bリーグ改修）
第2アリーナ	測量、補強鉄骨取付

注：上記は予定であり作業内容、期間が変わる場合があります。

富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る
期初改修施工業務及びBリーグ改修・魅力化改修施工業務

発注者：とやまアリーナコンセッション株式会社
施工者：前田建設工業(株)北陸支店
とやまアリーナ作業所
