

富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る  
期初改修施工業務及びBリーグ改修・魅力化改修施工業務

令和7年 12月

工事名：富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る期初改修施工業務及び  
Bリーグ改修・魅力化改修施工業務の現況についてお知らせ致します。

# 足場組立が完了し、外壁修繕工事を進めています。



10月末撮影




全景写真(南東上空より撮影)

11月末撮影

外壁修繕工事のための足場組立が完了し、外壁の清掃や塗装、シーリングの打ち替えを進めています。  
12月～来年3月に掛けて、外壁修繕工事が完了した範囲から足場の解体を進めていく予定です。

## 進捗状況

今回の工事の主目的のひとつ、地震に強い天井への改修を進めています

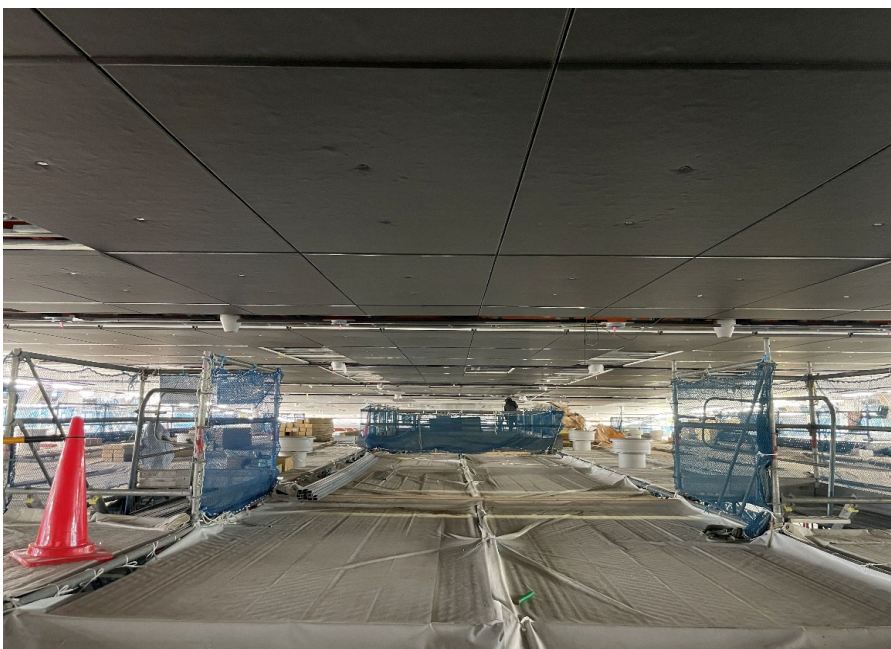

○第1アリーナの天井仕上げ材（グラスウールボード）の  
取付を進めています。  
12月中旬より内部足場の解体予定です。



○第2アリーナの補強鉄骨の取付を進めています。  
12月中旬より天井下地の組立を開始する予定です。

### ■R7.12月の主な工事予定

外部	外壁修繕工事、外部足場解体
第1アリーナ	天井下地組立、天井仕上げ、内部足場解体
	既存躯体解体、補修（Bリーグ改修）
第2アリーナ	測量、補強鉄骨取付、天井下地組立
注：上記は予定であり作業内容、期間が変わる場合があります。	

富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る  
期初改修施工業務及びBリーグ改修・魅力化改修施工業務

発注者：とやまアリーナコンセッション株式会社  
施工者：前田建設工業(株)北陸支店  
とやまアリーナ作業所
