

富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る
期初改修施工業務及びBリーグ改修・魅力化改修施工業務
令和8年3月

工事名：富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る期初改修施工業務及び
Bリーグ改修・魅力化改修施工業務の現況についてお知らせ致します。

外壁修繕工事が完了した箇所から足場解体を進めています。



1月末撮影




2月末撮影


外壁の清掃や塗装、シーリングの打ち替えを進めて作業が完了した箇所から順次足場解体を進めています。
4月初旬頃までには外部足場解体が完了し、外構工事を開始する予定です。

進捗状況

今回の工事の主目的のひとつ、地震に強い天井への改修を進めています

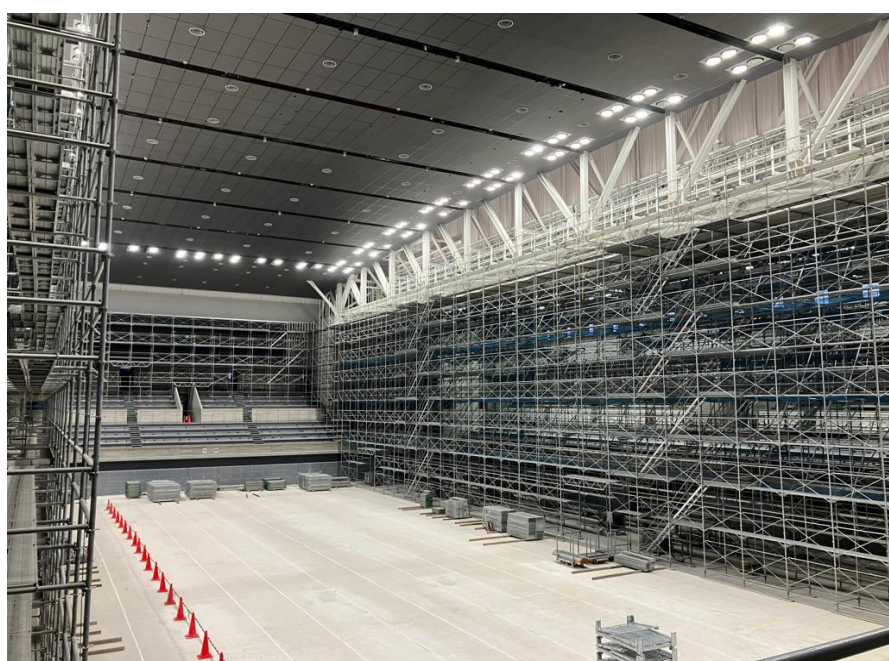

○第1アリーナの天井改修工事が完了し、足場解体を進めています。
今後は吊物機構更新や床研磨等の工事を行います。

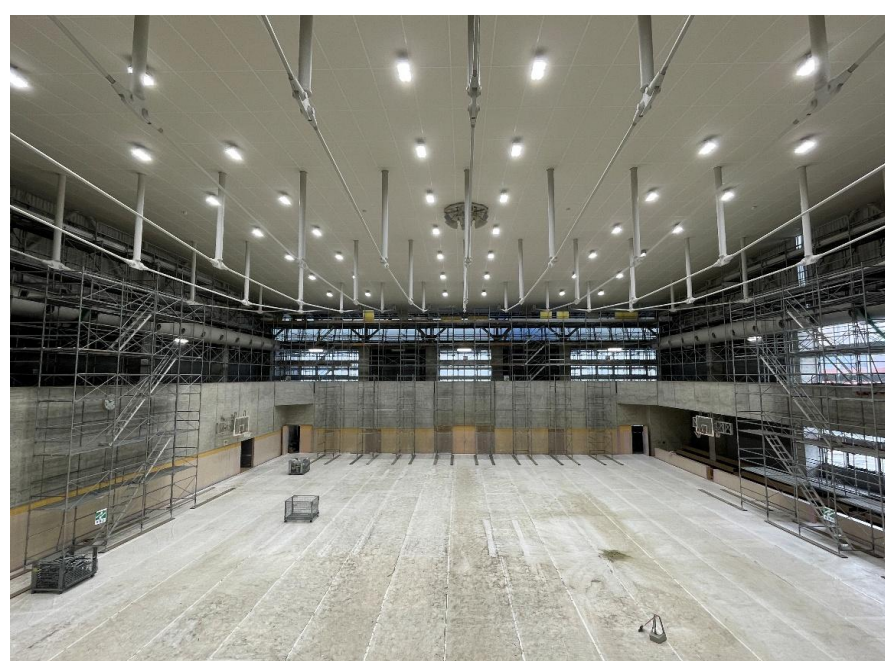

○第2アリーナの天井改修工事が完了し、足場解体を進めています。
今後はカーテン取付や床研磨等の工事を行います。

■R8.3月の主な工事予定

外部	屋上防水更新、外部足場解体
第1アリーナ	内部足場解体、吊物機構更新
	スイートルーム仕上げ
第2アリーナ	内部足場解体、床研磨

注：上記は予定であり作業内容、期間が変わる場合があります。

富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る
期初改修施工業務及びBリーグ改修・魅力化改修施工業務

発注者：とやまアリーナコンセッション株式会社
施工者：前田建設工業(株)北陸支店
とやまアリーナ作業所
